



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“  
[www.opc.moev.government.bg](http://www.opc.moev.government.bg)



Решения за  
по-добър живот


Договор № УР-051/29.01.2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

## РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН ЗА ПЕРИОДА 2014-2023 г.

*изпълнение на Договор № УР-051/29.01.2014 г.*

Проект DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и Резерват „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

### ТРИМЕСЕЧЕН ДОКЛАД за изпълнението на План-графика до Ръководителя на проекта за периода 01.02–30.04.2014 г.

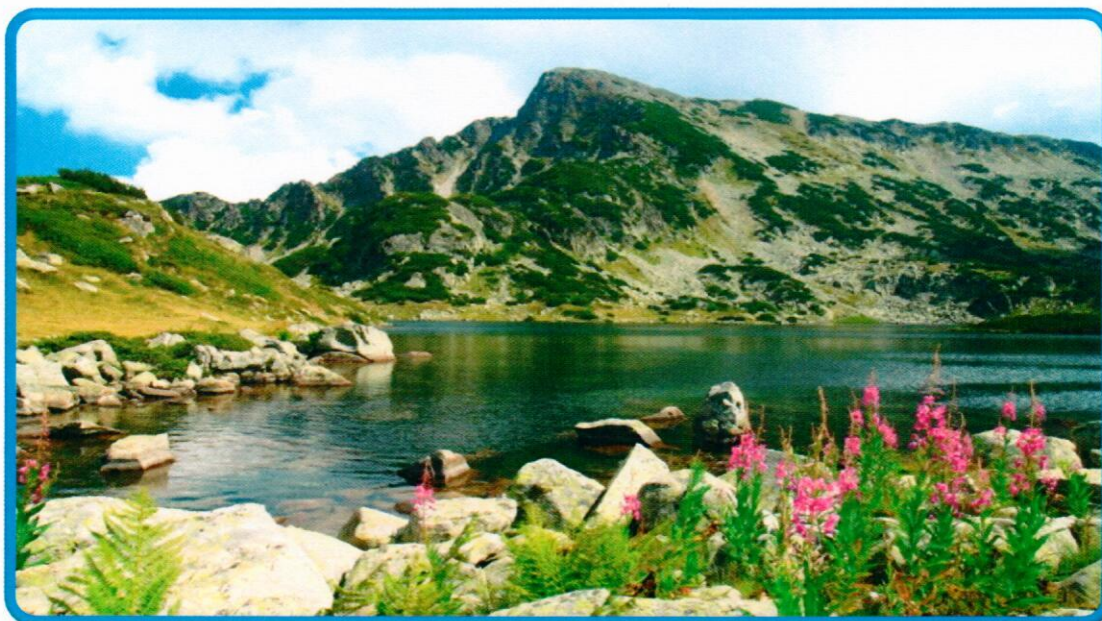

29.04.2014 г.



НАЦИОНАЛНА  
СТРАТЕГИЧЕСКА  
РЕФЕРЕНТНА РАМКА  
2007 – 2013



1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: [info@proles.bg](mailto:info@proles.bg)  
ISO 9001-2008 Certified Company





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“  
[www.opc.moev.government.bg](http://www.opc.moev.government.bg)



Решения за  
по-добър живот

Договор № УР-051/29.01.2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

<b>Заглавие на проекта:</b>	<b>Идентификационен номер на договора:</b>
„Разработване на План за управление на Национален парк Пирин за периода 2014-2023 г.“	№ УР-051/29.01.2014 г.
<b>Номер на договора за услуга:</b>	<b>Стойност на договора:</b>
УР-051/29.01.2014 г.	1 399 000 лв.
<b>Начална дата на договора:</b>	<b>Дата на приключване на договора:</b>
29.01.2014 г.	29.08.2015 г.
<b>Бенефициент / Възложител:</b>	<b>Лице за контакт:</b>
Дирекция „Национален парк Пирин“, гр.Банско- 2770, ул. „България“ 4, Р. България; За: Страхил Христов. Web адрес: <a href="http://www.pirin.bg">www.pirin.bg</a>	Страхил Христов тел.: 0749 88203, факс: 0749 88202 e-mail: <a href="mailto:pirin_np@abv.bg">pirin_np@abv.bg</a>
<b>Изпълнител:</b>	<b>Лице за контакт:</b>
„Пролес инженеринг“ ООД 1303 София, ул. „Пиротска“ № 64 Тел: + 359 2 986 7002, Факс: +359 2 986 6781 e-mail: <a href="mailto:info@proles.bg">info@proles.bg</a> <a href="http://www.pu-pirin.com">www.pu-pirin.com</a>	Антоний Стефанов, Управител и Ръководител на екипа за изработка на ПУ тел.: +359 888 383 654

Дата: 29.04.2014 г.

Изготвил: .....  
Ръководител на Екипа



Утвърдил: .....  
Ръководител на проекта

Одобрил: .....  
Директор на ДНП „Пирин“



1303 - гр. София, ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: [info@proles.bg](mailto:info@proles.bg)





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“  
[www.opc.moew.government.bg](http://www.opc.moew.government.bg)



Решения за  
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

## СЪДЪРЖАНИЕ

**Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика  
до Ръководителя на проекта за периода 01.02-30.04.2014 г.....1 – 7 стр.**

### Приложения :

*Приложение 1* – Документи от работна среща със заинтересованите страни за оповестяване началото на разработване на Плана за управление на НП Пирин;

*Приложение 2* - Доклад с преглед и оценка на съществуващи източници на информация с отношение към „Разработване на план за управление на НП Пирин“;

*Приложение 3* - Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008

*Приложение 4* - „Програма за Вътрешен контрол и верификация по изпълнението“

*Приложение 5* – Присъствени листове от проведени работни срещи в община Разлог, община Симитли и кметство Добринище с представители на общинската администрация, общински съвет, представители на други заинтересовани страни;

*Приложение 6* – Протокол и присъствен лист от проведен Научен съвет за обсъждане основни въпроси за напредъка на Проекта;

*Приложение 7* - График за теренно-проучвателните работи за периода м.април – м.октомври, 2014 г.;

*Приложение 8* – Писмо с предложение до Директора на ДНП „Пирин“ за смяна на ключов експерт „Връзки с обществеността“- Невена Давидова с неключов експерт - Веселена Паскова – документи за позиция ключов експерт.



## Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Ръководителя на проекта – за периода 01.02–30.04.2014 г.

Име:	Антоний Стефанов Стефанов
Позиция в екипа:	Ръководител на Екипа
<b>Дейности:</b>	
<p>Дейност 1. ПОДГОТВИТЕЛНА РАБОТА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ</p> <p>1.1. <i>Набиране, проучване и предварителна оценка на съществуваща информация и бази данни по направления, анализ на пропуските и компилация на наличните данни</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дирекцията на НП Пирин е предоставила съществуваща информация изготвена до момента, както и данни за текущи проекти и дейности имащи отношение към планиране на управлението.</li> <li>• Набиране, преглед и описване на базовата информация.</li> <li>• Предоставяне на експертите от Екипа според техните компетенции</li> <li>• Определяне на информация и данни, от значение за настоящия План за управление.</li> </ul> <p>1.2. <i>Попълване на основните празноти в информацията с данни, съществващи в МОСВ и ДНП Пирин, от други заинтересувани страни и/или чрез директни собствени изследвания и специфични проучвания, вкл. полеви</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Събиране, преглед и съпоставяне на наличната информация;</li> <li>• Приоритизиране на нужната информация, въз основа на опита и добрите практики в интегрираното планиране на управлението на защитените територии.</li> <li>• Оценка на качеството на съществуващата информация, спрямо изискванията на Заданието и изготвянето на анализ на пропуските.</li> <li>• Установяване на идентифицираните пропуски и зависимости към планираните дейности, които биха могли да доведат до забавяне</li> </ul> <p>1.3. <i>Изпълнение на Програма (схеми) за ангажиране на заинтересуваните страни в процеса на изготвяне и приемане на плана за управление и представяне на процеса за изработване на ПУ пред местните власти и общности.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Провеждане на поредица от срещи с Възложителя за подготовка и включване в Процеса</li> <li>• Идентифициране на заинтересуваните страни (ЗС) включително посочените в Заданието за разработване на ПУ и нови, за ангажиране на ЗС на местно, регионално и национално ниво.</li> </ul> <p>1.4. <i>Интегрални информационни системи, ГИС архитектура и база данни за територията на НП „ПИРИН“.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Всички ГИС-слоеве и атрибутивни данни, включени в Заданието за плана за управление се подготвят за нуждите на експертите за оценка на наличните данни и за теренно-проучвателните работи.</li> <li>• Подготвя се информация от съвместени цифрови модели на Кадастралните карти(землища гр.Банско, Добринище и гр.Разлог), Карти на възстановената</li> </ul>	

1



собственост, Горскостопански планове (лесоустройствени) за прилежащите територии, Ортофото планове, топографски карти.

- Резултатите от съвместените цифрови модели ще бъдат нанесени в ГИС системата на територията и предоставени на експертите по инвентаризация, геодезически заснемания и планиране.
- За целта ще се използват стандартните етапи при създаване на ГИС за установяване на пресечната точка (индексиране) на всички информационни източници, използвани за разработване на управленските цели и проекти.

#### Дейност 2: ПРОУЧВАТЕЛНА И АНАЛИТИЧНА РАБОТА С НАБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯ (подготовка)

- Подготовка за разработване на Част 0: Въведение;
- Местоположение и граници
- Площ на парка и на включените в него защитени територии
- Законов статут на НП „Пирин“ - проучване на документи от национални и международни доклади, решения и заповеди;
- Съществуващи проектни разработки
- Съществуващо функционално зонироване и режими на територията на националния парк
- Преглед на минали изследвания на екосистемите и биотопите

#### Дейност 5: РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДИ, ОТЧЕТИ, СБОРНИЦИ, ПРИЛОЖЕНИЯ

- Въстъпителен доклад до Ръководителя на проекта с План-график за изпълнение на поръчката
- Методика за инвентаризация на горските територии в границите на НП Пирин;
- Тримесечен доклад за изпълнението на План-графика до Ръководителя на Проекта

#### Дейност 6: ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЯ, РАБОТНИ СРЕЩИ

- Организиране в началния етап на разработване на Плана на Работна среща със ЗС за оповестяване на целите, процеса и задачите; обсъждане на наличната информация. Запознаване на участниците с предстоящо анкетироване (чрез структурирано интервю и въпросник) в отговор на очакванията на заинтересуваните страни, по отношение на техния принос към процеса и приемането на плана за управление,
- Подготовка и провеждане на срещи с представители на заинтересуваните страни от общините в района на НП Пирин за очертаване на визията и основните планирани дейности и проекти заложи в плановете им за развитие за програмния период 2014-2020 г.

#### Дейност 7: ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИ

- Мониторинг за вътрешен контрол съгласно Системата за управление на качеството, осъществяван чрез фигурата на „Упълномощен представител на ръководството“ – обучен одитор по системата ISO 9001-2008;
- Осъществяване на вътрешен независим контрол за верификация и валидизация на резултатите, чрез инструментариума „Научен съвет“ към Екипа разработващ ПУ.
- За изпълнение на горните основни дейности е необходима специална „Програма за Вътрешен контрол и верификация по изпълнението“, която включва конкретни дейности по етапи и видове дейности.



### Извършена работа по дейностите през периода:

#### Дейност 1: Подготвителна работа по изготвянето на Плана за управление

- Администриране на Екипа и предоставяне налична базова информация;
- Набиране, проучване и предварителна оценка на съществуваща информация и бази данни по направления, анализ на пропуските и компилация на наличните данни
- Получаване достъп до информация: Ортофото карти, Цифрови модели(КВС) и цифрови модели CAD формат

#### Дейност 2: Проучвателна и аналитична работа с набраната информация по направления(подготовка)

- Събиране, проучване и оценяване на набраната информация по направления
- Подготовка за изготвяне на методика за провеждане на национално представително изследване
  - Заявяване и получаване на база данни от ГРАО „Таблица на българските граждани“;
  - Определяне на населените места/ гнезда за получаване на стартови адреси от ГРАО за провеждането на националното представително изследване на терен
  - Изработване на статистически таблици на броя на населението и населените места, както и за трудова заетост, механично движение и туризма в общините в прилежащия район на НП „Пирин“
  - Изработване на графики по резултатите за броя на туристите през летния и зимния сезон, броя нощувки в хижите въз основа на Мониторинга на туристопотока, проведен от Д НПП в района на парка през 2012 и 2013 г.
- Подготовка за теренно-проучвателна работа включваща картен материал, ГИС-слоеве, GPS с инсталирани цифрови карти;
- Подготовка на графики за екипите и експертите. Осигуряване на транспорт с висока проходимост.

#### Дейност 5: Разработване на доклади, отчети, сборници, приложения

- Подготовка на Въстъпителен доклад до Ръководителя на проекта с План-график за изпълнение на поръчката със Списък-Декларация на Екипа и документи с доказателства за опит и квалификация на предложените неключови експерти;
- Разработване на Методика за инвентаризация на горските територии в границите на НП Пирин;
- Подготовка на Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Ръководителя на Проекта.

#### По Дейност 6: Организация и провеждане на обсъждания, работни срещи, семинари

- Инициране от „Пролес –инженеринг“ ООД работни среща с ръководството на Дирекцията на НП Пирин, Р-л на ЕУП и експертите на НП Пирин за обсъждане налична информация, съгласуване на задачите и подготовка на Работната среща за оповестяване началото на разработване на ПУ.
- Подготовка на Работната среща за оповестяване началото на разработване на ПУ с необходимата гласност: покани, обяви на сградите на общините, дневен ред, списък на поканени с участие на всички членове на Общественият консултативен съвет към ДНП;
- Подготовка на презентация за „целите, задачите и процеса на Плана за управление“;
- Подготовка на презентация за „предстоящо проучване на общественото мнение“
- Подготовка на текстове и материали за медиите за целите на ПУ на НП Пирин;
- Разработване на проект на сайт на План за управление на НП Пирин за периода 2014 - 2023 г.
- Подготовка на тематични папки за Работната среща с информационни материали.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



### Дейност 7: Вътрешен контрол и валидиране на резултатите, управление и финанси

- Подготовка за придобиване на Сертификат ISO 9001-2008
- Подготовка на „Програма за Вътрешен контрол и верификация по изпълнението“,
- Подготовка на Дневен ред и насрочване на заседание на Научен съвет – 28.04.2014 г.

### Резултати:

- Административно и правно обслужване в офиса на Изпълнителя в гр.София. Подписани договори с експертите от Екипа;
- Проучени и оценени от експертите по направления съществуващите източници на информация с отношение към разработване на Плана за управление на НП Пирин;
- Подготвени таблици по показатели от Заданието за съществуващи информационни източници и попълнен образец определен от Изпълнителя;
- Подготвени писма, изпратени чрез Възложителя ДНП, до национални, регионални институции и неправителствени организации за разработени и текущи проекти финансирани от донорски програми и държавния бюджет, с връзка с територията на НП Пирин, за избягване на двойно финансиране – 22 адреси;
- Разработен и представен на Възложителя Встъпителен доклад до Ръководителя на проекта с План-график за изпълнение на поръчката – представен на 28.02.2014 г. и 07.03.2014 г. на CD, съдържащ Обобщен график за разработване на ПУ на НП Пирин-Таблица№ 5 и Актуализиран график за изпълнение на дейностите - Таблица№ 6 от Встъпителния доклад. Съгласно бележки и препоръки от ДНП е представен Встъпителен доклад до Ръководителя на проекта с План-график за изпълнение на поръчката (преработен) – 25.03.2014 г.
- Проведена Работна среща със заинтересованите страни за оповестяване началото на разработване на Плана за управление на НП Пирин с участието на повече от 60 участници (Приложение 1) – 27.03.2014 г.
- Одобрен Встъпителен доклад до Ръководителя на проекта с План-график за изпълнение на поръчката – 11.04.2014 г.
- Разработена и представена на Възложителя „Методика за инвентаризация на горските територии в границите на НП Пирин“ – 17.04.2014 г.
- Разработен и приложен към настоящия Тримесечен доклад „Доклад с преглед и оценка на съществуващи източници на информация с отношение към „Разработване на план за управление на НП Пирин“ (Приложение 2)
- Придобиване от „Пролес инженеринг“ ООД на Сертификат за управление на качеството (Приложение 3)
- Разработена „Програма за Вътрешен контрол и верификация по изпълнението“ (Приложение 4)
- Проведени работни срещи в община Разлог, община Симитли и кметство Добринище с представители на общинската администрация, общински съвет, представители на други заинтересовани страни (Приложение 5) – 23 - 24.04.2014 г.
- Проведен Научен съвет за обсъждане основни въпроси за напредъка на Проекта. (Приложение 6) – 28.04.2014 г.
- Подготвен и представен в Дирекцията на НП Пирин Тримесечен доклад за изпълнение на План-графика до Р-ля на Проекта – 30.04.2014 г.
- Подготвен График за теренно-проучвателните работи за периода м.април – м.октомври, 2014 г. (Приложение 7)
- Проведени работни срещи за обсъждане, съгласуване и ангажиране на Възложителя – ДНП, ЕУП и другите заинтересовани страни;
- Проведени срещи в офиса на Изпълнителя с екипите от експерти по направления – флора, фауна, местообитания/гори, мониторинг, връзки с обществеността, ГИС и картен

4



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“  
[www.opc.moew.government.bg](http://www.opc.moew.government.bg)



Решения за  
по-добър живот

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

материал, абиотични фактори и социално-икономически аспекти.  
- Проведени срещи на Ключовите и Главни експерти с екипите си за уточняване организация, начини, методики, срокове и графици за подготовка на задачите.

**Констатирани затруднения:**

Ключов експерт „Връзки с обществеността“ Невена Давидова не е в състояние да изпълнява задълженията си поради майчинство. Представена е молба за освобождаване от позицията ключов експерт и участие в разработване на ПУ.

**Мерки за подобрене:**

Предложение за смяна на ключов експерт „Връзки с обществеността“ - Невена Давидова с неключов експерт - Веселена Паскова – документи за позиция ключов експерт  
(Приложение 8)

**Проведени срещи:**

06 и 07.02.2014 г. – Работна среща с ръководството и експертите на Дирекция НП Пирин

13.03.2014 г. – Работна среща с експерти от ДНП  
Срещи на PR- експерта за съгласуване с пресцентъра на МОСВ, с част от екипа на информационното звено към ОП ОС към МОСВ, с част от екипа на Национална служба за защита на природата към МОСВ, със звеното по публични комуникации в Д НПП.

27.03.2014 г. – Работна среща за оповестяване началото на разработване на ПУ  
27.03.2014 г. – Пресконференция за началото на разработване на ПУ

31.03.2014 г. – Среща с координатора и експерт от ЕУП

Проведени срещи в МОСВ за уточняване на необходимите изходни материали и заявяването им пред компетентните специалисти от ДНП Пирин и Дирекция НСЗП-МОСВ

23.04.2014 г. – Среща с представители на заинтересованите страни от община Разлог с участието на р-л и зам.р-л на екипа, гл.експерт „местообитания“ (Приложение 5 – присъствен лист)

**Резултати :**

- Постигане на съгласуваност с Възложителя по части и точки от Заданието за ПУ;

Съгласувана подготовка на Работната среща за оповестяване началото на разработване на Плана за управление.

Ангажиране на заинтересуваните страни в процеса на разработване на ПУ

Съгласуваност с експерти от ЕУП относно Въстъпителния доклад

Получаване на достъп до информация: Ортофото карти, Цифрови модели (КВС) и цифрови модели САД формат

Предоставена официално информация за планове, проекти, инвестиционни намерения за НП Пирин и прилежащите територии. Предадена информация в цифров вид за Концепция за развитие на туризма в подножието на Северен Пирин, Ски-зона „Кулиното“, община Разлог, Планово Задание за ОУП на община Разлог, 2013 г., Общински план за развитие на община Разлог 2014-2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“  
[www.opc.moew.government.bg](http://www.opc.moew.government.bg)



Решения за  
по-добър живот

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

24.04.2014 г. - Среца с представители на заинтересованите страни от община Симитли с участието на р-л и зам.р-л на екипа, гл.експерт „местообитания“ (Приложение 5 – присъствен лист)

г., Концепция за развитие на КТЗ „Кулиното“. Представяне и осъждане екологичното и социално-икономическо развитие на Община Разлог в аспект НП Пирин. Представителите на Пролес инженеринг отговаряха на въпроси и изясняваха процеса и целите на ПУ

Презентация на Общински план за развитие на Община Симитли за периода 2014-2020 г. от Е.Георгиева – зам.кмет на община Симитли. Представяне от заинтересованите страни виждания за бъдещото развитие на района на общината. Представителите на Пролес инженеринг отговаряха на въпроси и изясняваха процеса и целите на ПУ. Беше изяснен етапът на разработване на Общия устройствен план на община Симитли.

24.04.2014 г. - Среца с представители на заинтересованите страни от кметство Добринище, община Банско с участието на р-л и зам.р-л на екипа, гл.експерт „местообитания“ (Приложение 5 – присъствен лист)

Обсъждане на възможностите за реализиране на проекти със значение за района и неговото туристическо развитие. След провеждане на сесия на Общински съвет гр.Банско ще се направи официално становище с предложение отнасящо се за туристическото развитие на община Банско и НП Пирин, в.т.ч. кметство Добринище.

6

**Изпълнение на графика:**

**Спазен План-график** за Въстъпителен доклад, Работна среща за оповестяване, Пресконференция за началото на разработване на ПУ.

**Закъснение от План-график** предаването на „Методика за инвентаризация на горските територии в границите на НП Пирин“

**Причина за закъснението** за предаване на Възложителя на „Методика за инвентаризация на горските територии в границите на НП Пирин“ е **сложността на задачата.**

До настоящия момент не е направен опит на различни нива (Дирекция НСЗП, колективи от БАН, НПО и др. експерти да разработят и предложат „указания“, „ръководство“, или „методика“ за инвентаризация на горите и планиране на дейности в националните паркове, които са изключителна държавна собственост. Трябва да подчертаем, че Заданията към обществените поръчки за разработване на Планове за управление за национални паркове по отношение на инвентаризацията на горите, водите и водните площи са непълни и неточни, което позволява некачествено изпълнение на дейността.

- Наредба 6 за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в РБългария от 05.02.2004 г. е обект на обсъждане и промяна, която продължава вече 4 г. Този факт потвърждава трудността за определяне на методи за детайлно и



съвременно провеждане на инвентаризацията, избор на показатели в таксационните описания, картиране за създаване на географска информационна система за целите на управление на територията на Националния парк.

**Предстоящи дейности за следващия период:**

- Етап от изготвяне на електронен височинен модел на територията с точност, съгласно изискванията на Възложителя
- Етап от геодезическо заснемане на сградите и инфраструктурата в Парка с точност, съгласно изискванията на Възложителя
- Подготвяне на съвместени цифрови модели за картиране на горски и безлесни територии, събиране на материали и подготовка за изчертаване на тематични карти;
- Изпълнение на етап от инвентаризация на горски територии в границите на НП Пирин;
- Изпълнение на етап от теренни проучвания на екипите, картиране описания и характеристики, анализи и оценки на „абиотични фактори“, „биологична характеристика“, културна и социално-икономическа характеристика;
- Завършване и представяне на Възложителя на „Методика за мониторинг (преброяване) на посетителите на НП Пирин“
- Подготовка и провеждане на срещи с представители на заинтересованите страни от общини Струмяни, Кресна, Сандански, Гоце Делчев и Банско в района на НП, за очертаване на визията и основните планирани дейности в плановете, проекти и инвестиционни намерения на общините.
- Подготовка на Тримесечен доклад за изпълнение на План – графика до Ръководителя на проекта
- Подготовка на Доклад за шестмесечието до Ръководителя на проекта с актуализиран План-график по изпълнението на Договора и Предварителни отчети от проучвания, изследвания, анализи и оценки, извършени в процеса на разработване на плана през отчетния период
- Подготовка на Част 0: Въведение и Част 1: Описание и оценка на парка(етап от Предварителния доклад) разработени съгласно структурата на Заданието, до Ръководителя на Проекта

**Коментари (ако има):**

**Изготвил:**

Зам. р-л на Екип на Плана за управление:

**Утвърдил:** Ръководител на Проект:

Дата: 29.04.2014 г. Подпис: \_\_\_\_\_

Дата: 19.06.14г. Подпис: \_\_\_\_\_

**Одобрил:** Директор на ДНП Пирин

Дата: 19.06.14г. Подпис: \_\_\_\_\_





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“  
[www.opc.moew.government.bg](http://www.opc.moew.government.bg)



Решения за  
по-добър живот

Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“  
Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

## П Р И Л О Ж Е Н И Я

**Приложение 1** – Документи от работна среща със заинтересованите страни за оповестяване началото на разработване на Плана за управление на НП Пирин;

**Приложение 2** - Доклад с преглед и оценка на съществуващи източници на информация с отношение към „Разработване на план за управление на НП Пирин“;

**Приложение 3** - Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008

**Приложение 4** - „Програма за Вътрешен контрол и верификация по изпълнението“

**Приложение 5** – Присъствени листове от проведени работни срещи в община Разлог, община Симитли и кметство Добринище с представители на общинската администрация, общински съвет, представители на други заинтересовани страни;

**Приложение 6** – Протокол и присъствен лист от проведен Научен съвет за обсъждане основни въпроси за напредъка на Проекта;

**Приложение 7** - График за теренно-проучвателните работи за периода м.април – м.октомври, 2014 г.;

**Приложение 8** – Писмо с предложение до Директора на ДНП „Пирин“ за смяна на ключов експерт „Връзки с обществеността“ - Невена Давидова с неключов експерт - Веселена Паскова – документи за позиция ключов експерт.
